
Teoría corta, en dibujos

1 · Los roles del equipo

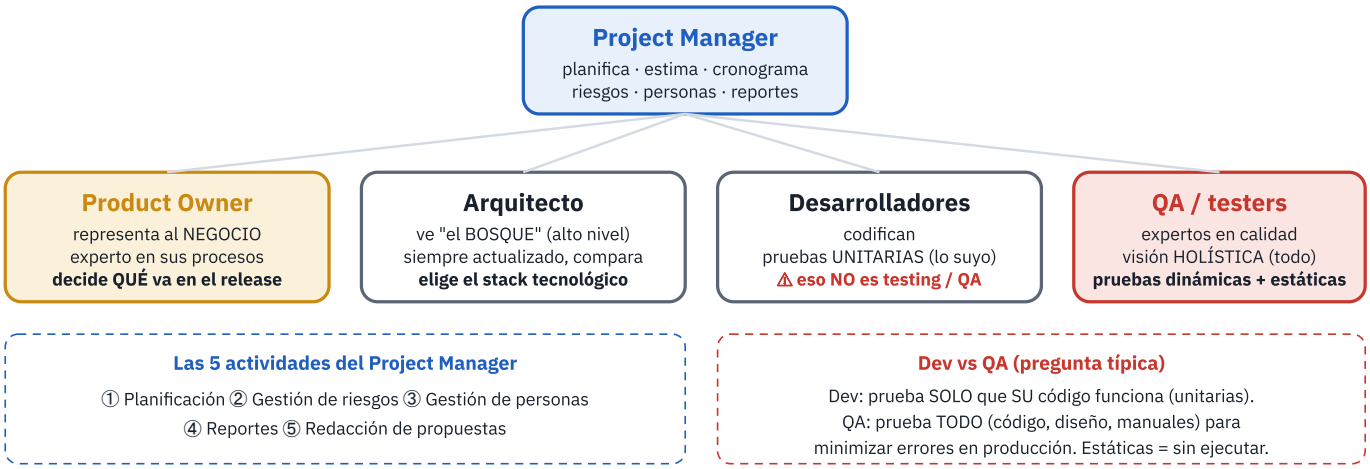


4 factores para gestionar personas: Consistencia (trato parejo) · **R**espeto (a las distintas habilidades) · **I**nclusión (escuchar a todos) · **H**onestidad (sobre lo que va bien y mal). Truco: **"CRIH"**.

2 · Proyecto vs proceso, y por qué el software es difícil

Proceso = el día a día, se repite.
Proyecto = algo **único**, con **inicio y fin**, dentro de **costo, cronograma y calidad**.
Éxito = a tiempo · dentro del presupuesto · cumple expectativas · equipo que funciona.

¿Por qué es difícil gestionar software?
① El producto es **intangible** (no ves el avance como en un puente).
② Los proyectos grandes son **únicos ("one-off")**.
③ Los **procesos varían** de una organización a otra.

3 · Milestone vs baseline

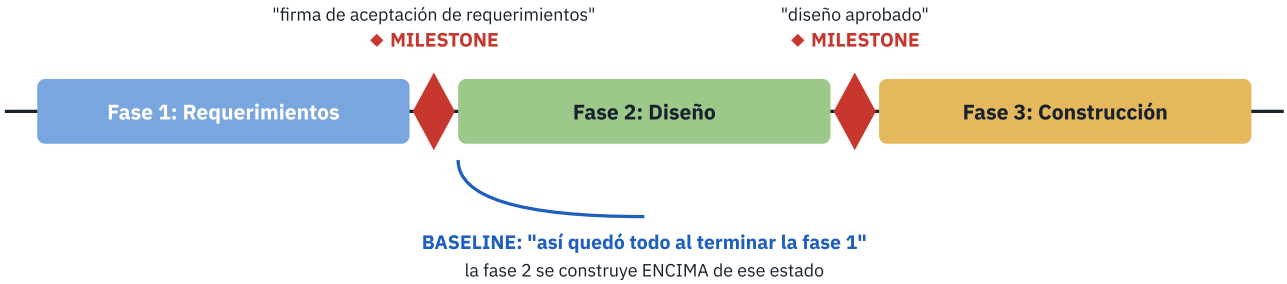


	Milestone (hito)	Baseline (línea base)
Qué es	Un **evento de duración 0**, muy importante	El **estado** del proyecto en un instante (normalmente al final de una fase)
Cómo se controla	**Binario**: ocurrió o no ocurrió (1 o 0), sin dudas	Sirve de **punto de partida** para la siguiente fase
Ejemplos	firma de aceptación de requerimientos · correo de entrega en Aula Virtual · lanzar el buque al agua	"diseño terminado y aprobado" · la prueba diagnóstica al inicio del curso

⚠️ **¿Por qué un milestone controla mejor que una actividad?** Porque "la actividad va al 70 %" es subjetivo (¿60? ¿75?); el milestone es **1 o 0**. · **Todo milestone es un evento, pero no todo evento es un milestone.**

🎤 **Scheduling** = hacer el cronograma. Tareas de **máximo 8 horas** (aceptable hasta 16). Los retrasos cuestan al **cliente** (pierde mercado) y al **contratista** (multas). Se hace en el día 0 y luego se **monitorea**.

4 · Gantt vs red AoA

Gantt: lista a la izquierda, barras en el calendario

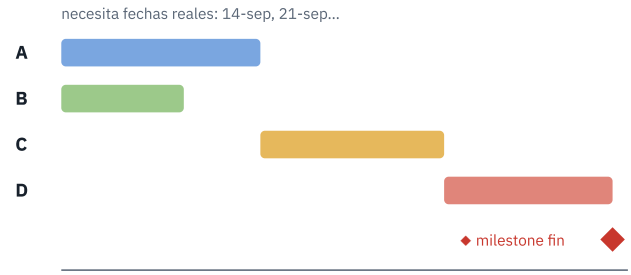

✅ **Ventaja del Gantt: fácil de entender** (se hace en Excel). Por eso es el más usado: por sencillez, no porque sea el mejor.

❌ **Limitaciones del Gantt (memorízalas):**
① **No muestra bien las dependencias.**
② **No se ve el camino crítico.**
③ **Necesita una fecha de inicio real.**

La red AoA resuelve las 3: dependencias a la vista, camino crítico con línea doble, y fechas relativas (t = 0).

🎤 **Camino crítico en la vida real:** reprobar Cálculo o Ingeniería de Software I te atrasa un semestre (crítica); reprobar otra materia quizás no (tiene holgura).
