
Taller A: la red con valores

Plazo del enunciado: **45 semanas**.

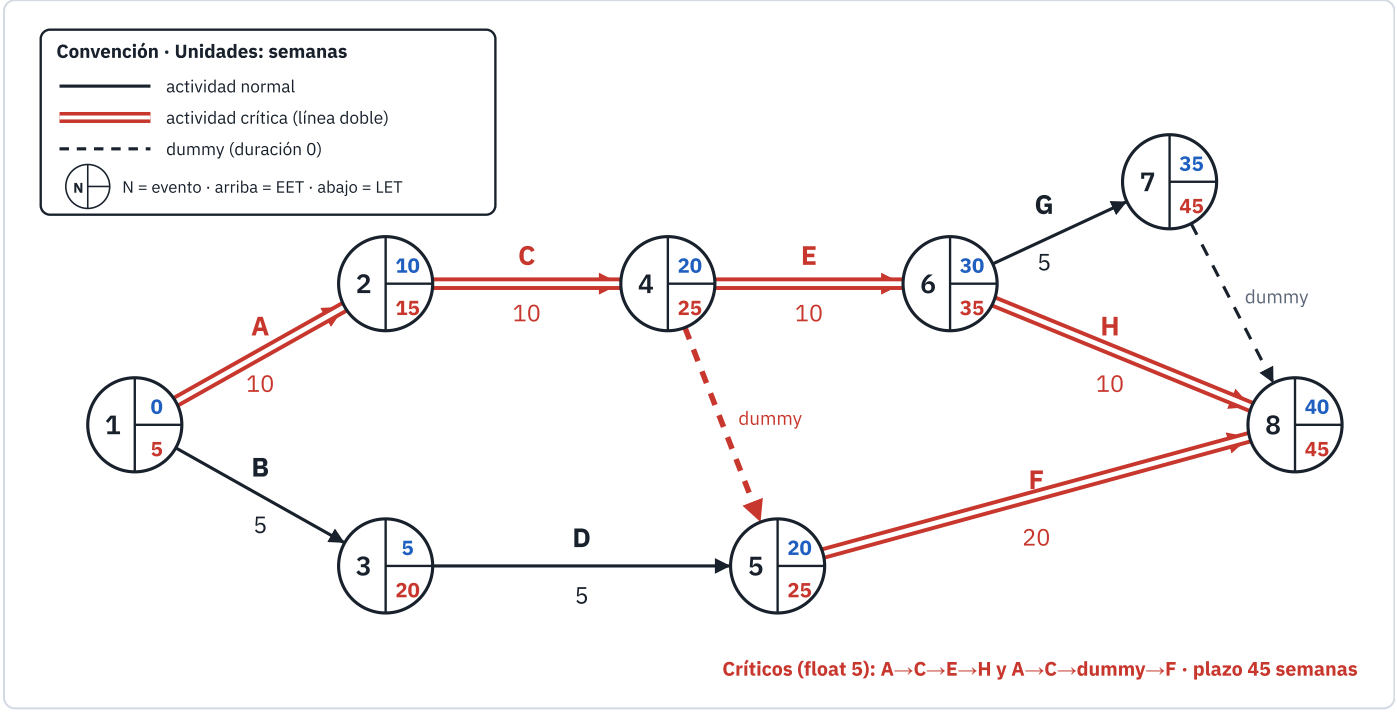

Círculo	Arriba (suma, mayor)	Abajo (desde 45, resta, menor)
8	max(20+20, 35+0, 30+10) = **40**	**45** (el plazo)
7	30+5 = **35**	45−0 = **45**
6	20+10 = **30**	min(45−5, 45−10) = **35**
5	max(20+0, 5+5) = **20**	45−20 = **25**
4	10+10 = **20**	min(35−10, 25−0) = **25**
3	0+5 = **5**	25−5 = **20**
2	0+10 = **10**	25−10 = **15**
1	**0**	min(15−10, 20−5) = **5**

Tarea	abajo fin − arriba inicio − dura	Float
A	15 − 0 − 10	**5** ⭐
B	20 − 0 − 5	15
C	25 − 10 − 10	**5** ⭐
D	25 − 5 − 5	15
E	35 − 20 − 10	**5** ⭐
F	45 − 20 − 20	**5** ⭐
G	45 − 30 − 5	10
H	45 − 30 − 10	**5** ⭐

Ojo con el plazo: sin plazo el proyecto duraría **40** (arriba del círculo 8). Como el enunciado da **45**, el abajo del final es 45 y **el inicio da 5, no 0**: todo tiene 5 semanas de holgura. Por eso el camino crítico es el de **menor** float (5), no el de float 0. Hay **dos** caminos críticos: **A → C → E → H** y **A → C → (dummy) → F**.
